


송산그린시티 남측지구 공사진행 현황 (2026. 6월 기준)

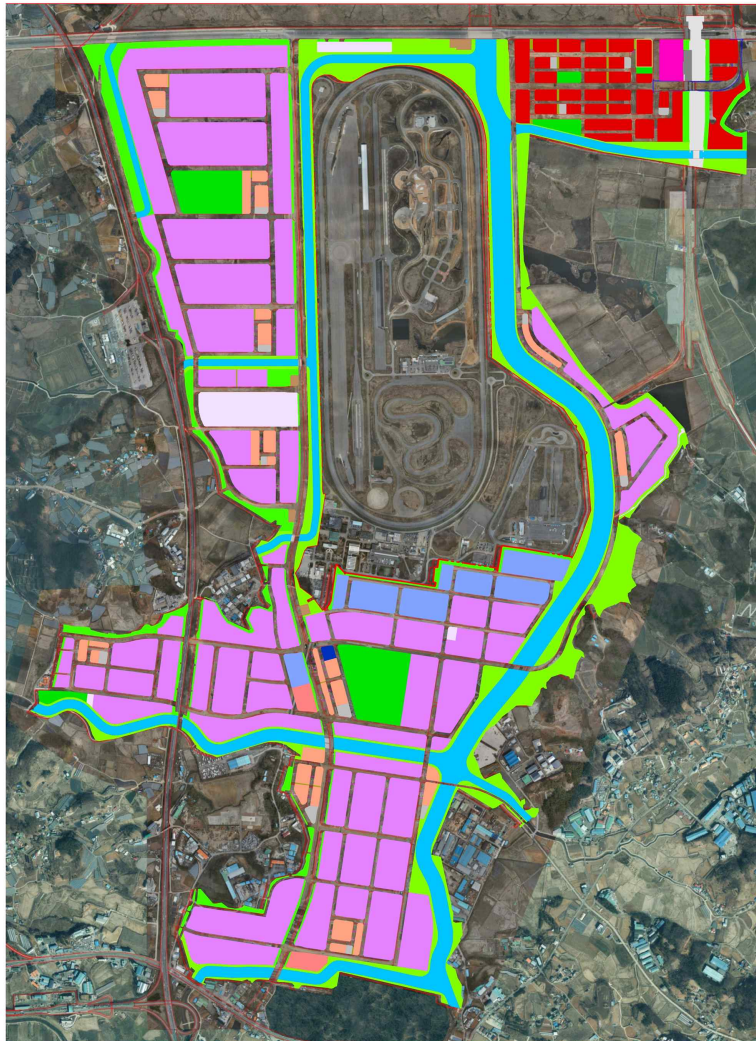

범례

단독주택	인입주택
저층아파트	중고층아파트
주상복합	상업업무
근린생활시설	공공행정
문화·복지	여유타운
심버림플렉스	교육시설
지동원리대공원	스포츠컴플렉스
산업용지	R&D용지
지원시설	여코팜타운
마린리조트	국제테마파크
공영치고지	치량기지
철도역	철도노선
광장	농수산물유통센터
향사센터	골프장
종교시설	공급처리시설
주유소	주차장
보행자친화도로	유보지
공원	하천
녹지	

[산업21~23 BL, 근린공원3] 일대 공사진행 현황
[2026. 6월 기준] 1공구



- ☐ 토공 및 연약지반처리 작업 완료
- ☐ 하수관로 매설 완료
- ☐ 상수관로 매설 완료
- ☐ 주변도로(중로1-64~65) 포장예정('26년)
- ☐ 주변도로(중로2-71) 개발계획변경 추가도로부 연약지반처리 진행중('26년)
- ☐ 주변도로(중로2-71) 상하수관로 매설 예정('26년)

[산업1~5 BL, 주차장 BL] 일대 공사진행 현황
[2026. 6월 기준] 1공구



- ☐ 토공 및 연약지반처리 작업 완료('23년)
- ☐ 하수관로 매설 완료
- ☐ 상수관로 매설 완료
- ☐ 주변도로(대로3-24, 중로2-56 등) 포장 진행중('26년)
- ☐ 열병합부지 계획변경 공사예정(26년)

[산업6~13 BL] 일대 공사진행 현황
[2026. 6월 기준] 1공구



- ☐ 토공 및 연약지반처리 작업 완료 ('26년)
- ☐ 하수관로 매설 완료
- ☐ 상수관로 매설 완료
- ☐ 주변도로(대로3-24, 중로1-62 등) 포장 진행중('26년)

[산업7 BL] 일대 공사진행 현황
(2026. 6월 기준) 1공구



- ☐ 토공 및 연약지반처리 작업 완료
- ☐ 하수관로 매설 완료
- ☐ 상수관로 매설 완료
- ☐ 주변도로(대로3-24, 중로2-53) 포장 진행중('26년)

[연구1~7, 산업13~19 BL] 일대 공사진행 현황
[2026. 6월 기준] 2공구



- ☐ 토공 및 연약지반처리 완료('20년)
- ☐ 상수관로 매설 완료('23년), 하수관로 매설 완료('24년)
- ☐ 도로(중(보)1-61, 중(국)2-55 등) 포장 완료('25년)
- ☐ 교통안전시설물 설치 예정('26년)
- ☐ 수로6교 상부공(아스콘 포장, 접속 슬래브) 예정('26년)

[상업지역, 주차장 BL] 일대 공사진행 현황
[2026. 6월 기준] 2공구



- ☐ 토공 및 연약지반처리 진행 중('26년 완료 예정)
- ☐ 상하수관로 매설 진행 중('26년 ~ '27년)
- ☐ 수로10교 상부공 진행 중('26년 ~ '27년)
- ☐ 도로(대(보)2-2, 중(집)1-2 등) 포장 및 교통안전시설물 설치 예정('28년)

[산업25~35 BL] 일대 공사진행 현황
[2026. 6월 기준] 3공구



- ☐ 토공 및 연약지반처리 작업 완료('25년말)
- ☐ 우,오수관로 매설 작업 완료예정('26년 하반기)
- ☐ 상하수관로 매설 착수 완료예정('26년 하반기)
- ☐ 주변도로(중2-75~83 등) 아스콘 포장예정('26년하반기)
- ☐ 교량시공완료 예정('26년 상반기)

[산업단지 36~43BL, 주차17] 일대 공사진행 현황
[2025. 6월 기준] 3공구



- ☐ 토공 및 연약지반처리 작업 완료('24년)
- ☐ 우,오수관로 매설 작업 완료예정('26년 상반기)
- ☐ 상하수관로 매설 완료('26년 상반기)
- ☐ 주변도로(중로(국)2-54,소로(국)2-6 등) 아스콘 포장예정('26년 하반기)
- ☐ 교량기초 공사 작업 예정('27년)
- ☐ 비개착터널 시공예정('26년 하반기)
